

O.S. Nº: 083799

ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL SP



	Ordem de Serviço	Data Programada	Aplicação
	083799	30/07/2026	141813 Plataforma Autopropelida Tesoura 20/30 ES - N. Serie 141813
Informações Gerais			Padrões de Execução
Filial: 3 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL SP Código do Contrato: Cliente: 00717 - ESTAF EQUIPAMENTOS S/A - FL SP Solicitante/Funcionário: 00700 - LUCAS VAZ DA SILVA Responsável: 00797 - ADRIAN LEMOS PONTES Distância Estaf x Cliente: 0 Endereço de Obra:			Prazo de Entrega: 30/07/2026 Início Parada: 10:11 Fim Parada: 09:19 Tempo de Execução: 00:00 Tipo de Manutenção: CHK - CHECKLIST Prioridade: Média Horímetro: 0
Serviço Solicitado: o.s de venda (141813)			
Observações: ORDEM DE SERVIÇO CHECK-LIST DE VERDA DADOS DO ATENDIMENTO Registre aqui o Horímetro: 00613.0 Observações complementares: Equipamentodisponível Local do atendimento: [X]Estaf []Cliente Segue abaixo RELATÓRIO FOTOGRÁFICO do atendimento. (Registro obrigatório da Parte Externa e Interna do Equipamento e Local de Uso do Equipamento). Número da bateria: 000943 Modelo da Bateria: JLG Ano da bateria: Não Indentificado Nivel de elétrolito (água): conforme Tensão antes do processo (em vazio): 6.3V Processos aplicados: através da função de elevação da primaria Tensão de bateria (sob estresse):5.8V Medição com densímetro:1,20 1,18 1,20 Aprovada? Sim (X) Não () Número da bateria 000937: Modelo da Bateria: JLG Ano da bateria: Não Indentificado Nivel de elétrolito (água): conforme Tensão antes do processo (em vazio): 6.3V Processos aplicados: através da função de elevação da primaria Tensão de bateria (sob estresse):5.8V Medição com densímetro:1,26 1,24 1,26 Aprovada? Sim (X) Não () Número da bateria: 000940 Modelo da Bateria: JLG Ano da bateria: Não Indentificado Nivel de elétrolito (água): conforme Tensão antes do processo (em vazio): 6.6V Processos aplicados: através da função de elevação da primaria Tensão de bateria (sob estresse):6.0V Medição com densímetro: 1,20 1,1,22 1,22 Aprovada? Sim (X) Não () Número da bateria: 000934 Modelo da Bateria: JLG Ano da bateria: Não Indentificado Nivel de elétrolito (água): conforme Tensão antes do processo (em vazio): 6.3V Processos aplicados: através da função de elevação da primaria Tensão de bateria (sob estresse): 6.0V Medição com densímetro: 1,24 1,20 1,20 Aprovada? Sim (X) Não () CONCLUSÃO TÉCNICA O equipamento foi inspecionado e testado conforme o procedimento interno. Após a realização dos testes funcionais e inspeções visuais, encontra-se em condições de entrega ao cliente.			
Observações do Plano:			
E = EXECUTADO / P = PENDENTE / N = NÃO EXECUTADO			
E	P	N	Descrição
✓			001-PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (NÚMERO DE PATRIMÔNIO)

✓			002-PARTE EXTERNA - CHASSI - PARTE CESTO					
✓			003-PARTE INTERNA - MOTOR - SISTEMA HIDRÁULICO					
✓			004-PAINÉIS - CONTROLES - INDICADORES					
✓			005-PNEU DIANTEIRO - DIREITO					
✓			006-PNEU DIANTEIRO - ESQUERDO					
✓			007-PNEU TRASEIRO - DIREITO					
✓			008-PNEU TRASEIRO - ESQUERDO					
✓			009-BANCO DE BATERIAS					
✓			010-HORÍMETRO					
✓			011-BOTÃO DE EMERGÊNCIA					
✓			012-GIROFLEX					
✓			013-PORTA MANUAL					
			014-PRESENÇA DE RASTREADOR (INTERNO CONTROLE)					
E	P	N	Ocorrência	Causa	Serviço	Material	Qtde Real	
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
✓					-	-		
					-	-		
					-	50851 - Placa de Circuito Eletronico (2440316580)	1	
					-	50851 - Placa de Circuito Eletronico (2440316580)	1	
Executante				Início do Serviço		Fim do Serviço		Tempo
00797 - ADRIAN LEMOS PONTES				03/08/2026 10:11		03/08/2026 10:36		00:25
00797 - ADRIAN LEMOS PONTES				03/08/2026 15:16		03/08/2026 16:03		00:47
00797 - ADRIAN LEMOS PONTES				04/08/2026 08:01		04/08/2026 09:19		01:18
Classificação da Visita					Responsabilidade da Falha			
Assinatura da O.S.								
								
SIGN-Adrian 03082026-101320								

Relatório Fotográfico - Registro de Serviços

camera_03_08_2026_10_13_46.jpgcamera_03_08_2026_10_15_07.jpg



camera_03_08_2026_10_15_30.jpgcamera_03_08_2026_10_15_52.jpg



camera_03_08_2026_10_16_12.jpgcamera_03_08_2026_10_16_38.jpg



camera_03_08_2026_10_20_44.jpg



camera_03_08_2026_10_21_03.jpg



camera_03_08_2026_10_21_30.jpg



camera_03_08_2026_10_21_46.jpg



camera_03_08_2026_10_22_17.jpg



camera_03_08_2026_10_22_42.jpg



camera_03_08_2026_10_23_06.jpg



camera_03_08_2026_10_23_35.jpg



camera_03_08_2026_10_24_05.jpg



camera_03_08_2026_10_24_55.jpg



camera_03_08_2026_10_25_52.jpg



camera_03_08_2026_10_26_09.jpg



camera_03_08_2026_10_26_22.jpg



camera_03_08_2026_10_26_36.jpg



camera_03_08_2026_10_27_10.jpg



camera_03_08_2026_10_27_54.jpg



camera_03_08_2026_10_28_22.jpg



camera_03_08_2026_10_32_12.jpg



camera_03_08_2026_10_32_31.jpg



camera_03_08_2026_10_32_45.jpg



camera_03_08_2026_10_33_04.jpg



camera_03_08_2026_10_33_23.jpg




camera_03_08_2026_10_33_38.jpg



camera_03_08_2026_10_34_01.jpg

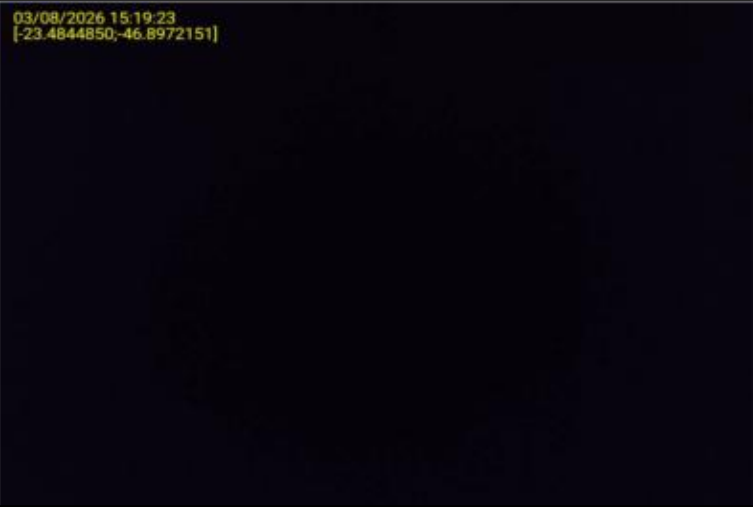

camera_03_08_2026_10_34_20.jpg 03/08/2026 10:34:20 [-23.4845103;-46.8969265] 	camera_03_08_2026_15_18_11.jpg 03/08/2026 15:18:11 [-23.4844305;-46.8972828] 
camera_03_08_2026_15_18_27.jpg 03/08/2026 15:18:27 [-23.4846877;-46.8969363] 	camera_03_08_2026_15_19_23.jpg 03/08/2026 15:19:23 [-23.4844850;-46.8972151] 
camera_03_08_2026_15_19_46.jpg 03/08/2026 15:19:46 [-23.4847194;-46.8969700] 	camera_03_08_2026_15_20_17.jpg 03/08/2026 15:20:17 [-23.4845559;-46.8970414] 

camera_04_08_2026_08_09_01.jpg



Relatório Fotográfico - Fotos Gerais do Equipamento

camera_04_08_2026_09_16_25.jpg



camera_04_08_2026_09_16_45.jpg



camera_04_08_2026_09_17_04.jpg



camera_04_08_2026_09_17_16.jpg



camera_04_08_2026_09_17_37.jpg



camera_04_08_2026_09_18_26.jpg



camera_04_08_2026_09_18_50.jpg

